

POSIZIONE TUBAZIONE

Riportare in codice:

- ☒ 1 Tubazione interrata
- ☐ 2 Tubazione aerea
- ☐ 3 Tubazione subacquea
- ☐ 4 Tubazione "sub-alveo"
- ☐ 5 Allacc. interrato

CLASSE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 0,04 bar (BP)
- ☐ 2 0,5 bar (MPA)
- ☐ 3 1,5 bar (MPB)
- ☐ 4 5 bar (MPB)
- ☐ 5 12 bar (MPC)
- ☐ 6 24 bar (AP)
- ☐ 7 >24 bar (AP)

ENTITÀ TRAFFICO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Leggero
- ☐ 2 Pesante
- ☒ 3 Scarso
- ☐ 4 Intenso

TIPO DEL SOTTOSUOLO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Normale - agricolo
- ☐ 2 Roccioso
- ☐ 3 Sabbioso
- ☒ 4 Ghiaioso
- ☐ 5 Di riporto
- ☐ 6 Misto a macerie
- ☐ 7 Argilloso
- ☐ 9 Non identificato

CAUSALI SOSTITUZIONI

- ☐ Sost. per rifacimento pavimentazione stradale
- ☐ Sost. causa lavori altri enti
- ☒ Annullamento o sostituzione per obsolescenza
- ☐ Annullamento o sostituzione per potenziamento
- ☐ Annullamento o sostituzione per altri motivi

SEDE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 Carreggiata
- ☐ 2 Carreggiata su strada alberata
- ☐ 3 Marciapiedi
- ☐ 4 Marciapiedi su strada alberata
- ☐ 5 Spartitraffico
- ☐ 6 Spartitraffico su strada alberata
- ☐ 7 Fuori sede stradale
- ☐ 8 Su area di rispetto
- ☐ 9 Su opera d'arte (ponti, ecc.)

TIPO DI PAVIMENTAZIONE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Sterrato
- ☒ 2 Bitumato
- ☐ 3 Lastricato
- ☐ 4 Calcestruzzo
- ☐ 5 Porfido
- ☐ 6 Marmo, quarzite, ecc.
- ☐ 7 Terreno agricolo
- ☐ 8 Acciottolato
- ☐ 9 Mattonato o piastrellato

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Attraversamento strada ANAS
- ☐ 2 Percorrenza strada ANAS
- ☐ 3 Attraversamento strada provinciale
- ☐ 4 Percorrenza su strada provinciale
- ☐ 5 Attraversamento su strada comunale
- ☒ 6 Percorrenza su strada comunale
- ☐ 7 Attraversamento su strada privata
- ☐ 8 Percorrenza su strada privata
- ☐ 9 Attraversamento fisico galleria
- ☐ 10 Attraversamento sotto galleria
- ☐ 11 Percorrenza galleria
- ☐ 12 Percorrenza su terreno comunale
- ☐ 13 Percorrenza su terreno demaniale
- ☐ 14 Percorrenza su terreno privato
- ☐ 15 Percorrenza su terreno sociale
- ☐ 16 Attraversamento autostradale
- ☐ 17 Percorrenza autostradale
- ☐ 18 Attraversamento strada vicinale
- ☐ 19 Percorrenza strada vicinale
- ☐ 20 Attravers./Percorr. opera d'arte

800/5/55



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro Via San Marino 75-76

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

6140

Descrizione lavoro Nuovo Impianto

Destinazione contabile

Centro Operativo

1109

Categ.

21

Specie

39

Centro di Costo

2945

Commissa

9634

Esecutore Impianto: Ditta

Leone D.

Ass. Brovero

Data 9-4-84

P. G.

N° 1

Schizzo n°

43477

Esecutore attacco: Sq.

Ciavarella


Ass. Brovero

Data 9-4-84

col. 6/40

ril. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

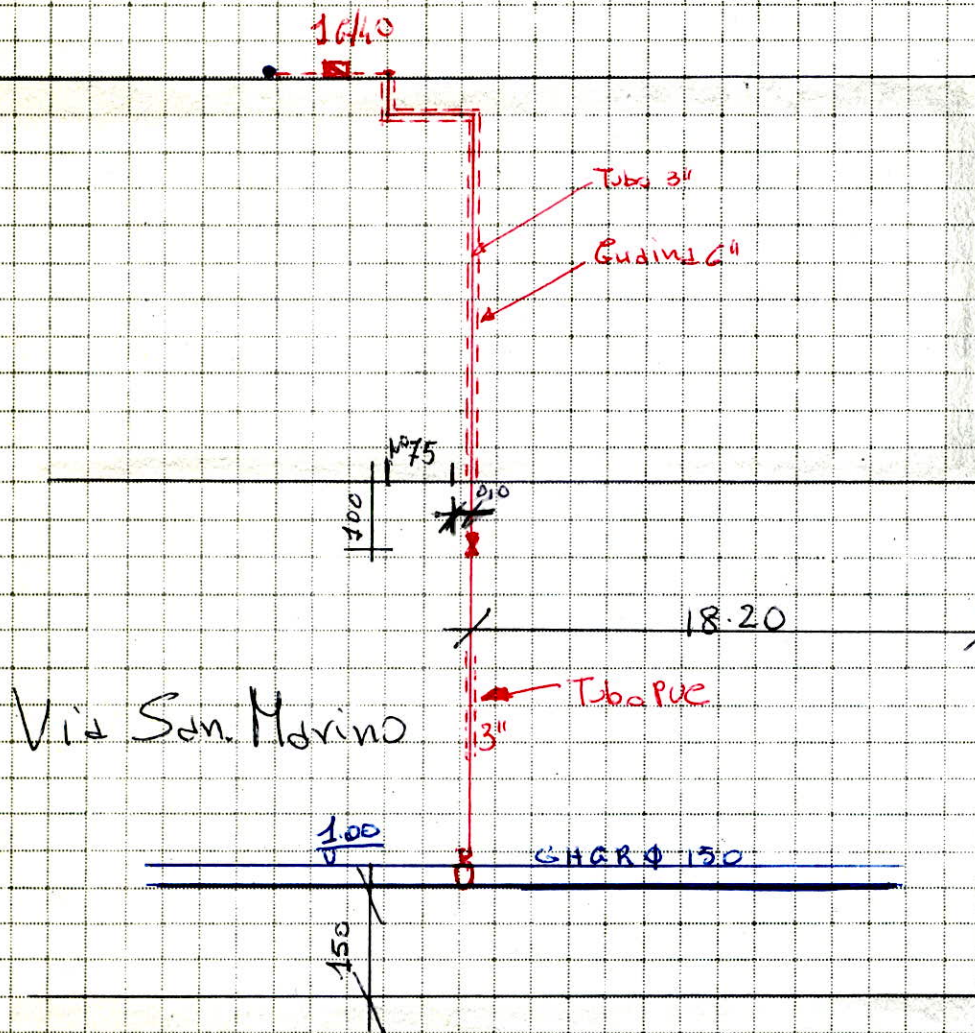

Via Lomvsei

Via San Marino

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.o.

N° Regolare

controllata da Ciavarella

Data 9-4-84

V. Resp.

NOTE

Valvola in pozzetto $\phi 3''$

Non Esiste schizzo

SVILUPPO

ϕ	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"			2.00	
2"			3.00	
2 1/2"			4.10	
3"	18.80	14.60	8.00	
APPCIO				3.50
150				14.60
Tot.	18.80	14.60	15.10	18.10

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia $\left\{ \begin{array}{l} \text{esistente} \quad \square \\ \text{da eseguire} \quad \square \end{array} \right.$
- ☐ taglio colonna ϕ
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Reporto

POLIVALENTE 4

riport. su mappa N° 789

data 24/4/84

disegnatore H. Gribaudi

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro:

Via San Martino 77

SCHIZZO: 3123H

Cat. lavoro

Commessa

Lavoro richiesto:

Riconosciuto

Esecutore

Conto

S/C

PUNTI

GAS

Esecuzione Imp.: Artig.

Ass.

Data

Esecuzione att.: Sq.

Mazzei

Ass.

Camolotto

Data


22/9/68

N. 32

Cal. 10

Sviluppo ml.

Dis.: Rosso 24/4/68

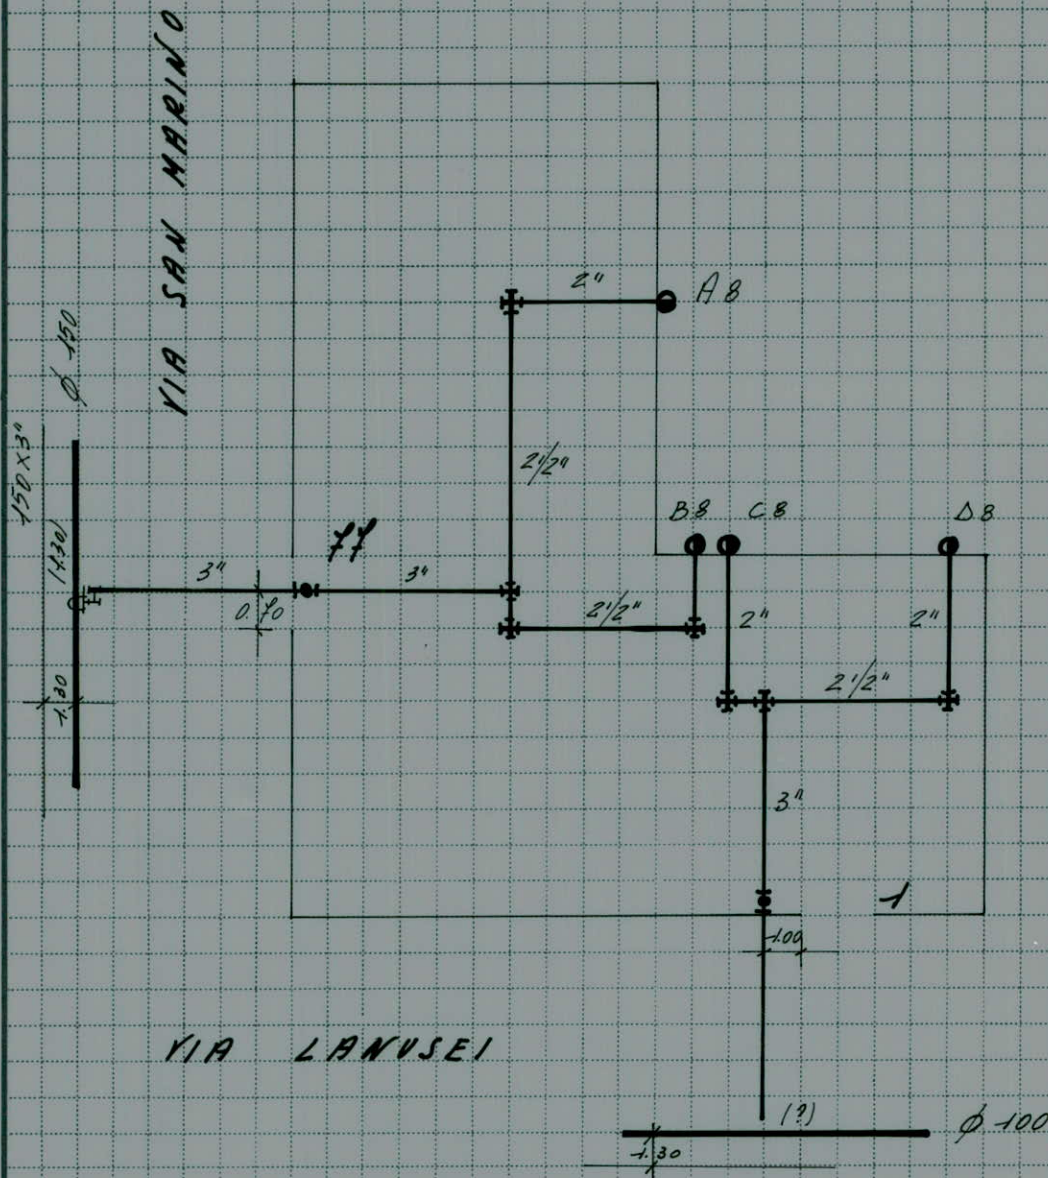

Collaudo n°

Sgombri totali

Sgombri parziali

Modifiche e riparazioni

Q

Colonne

Prese

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

Tot.

A.I.I.

Pb.

Fe.
